

朽木フィールド調査報告

調査期間：2013/1/31

メンバー：平田、小松、テラマジ、川口、堀内、シンチャオ

作業項目

- ①3 流域間伐作業に伴う、KS31 遮断プロット、斜面プロットの一時撤去
- ②遮断プロット、斜面プロットの水サンプル回収、メンテナンス
- ③テンシオメータの回収

8:30 FM 唐沢山到着

9:00 作業開始

午前 KS31 遮断プロット・斜面プロット撤去、水サンプル回収



遮断プロット撤去前



遮断プロット撤去後



斜面プロット撤去前



斜面プロット撤去後
(タンク、三角堰、塩ビパイプ、ロガーのみ撤去)



雨量計のコードが切断されていた。
→再設置時に交換



雨量計、雨水サンプラー、owl ロガーの位置は、ペグとピンクテープでマーキング。



機材仮置き場。林道脇のオープンスペース



機材仮置き場。林道脇のオープンスペース

午後 **KS24** サンプル回収、メンテナンス、テンシオメータ回収
KS22 サンプル回収




KS22 斜面プロット タンクの洗浄



林外雨サンプリング

機材の仮置き場

林道脇のオープンスペースに仮置き。

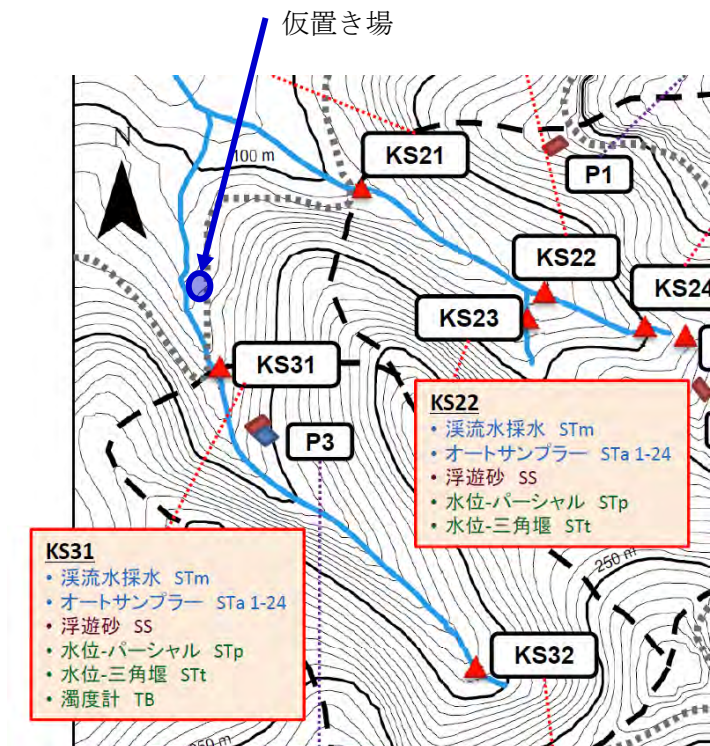

機材仮置き場の位置
